

PROGETTO ESECUTIVO SICUREZZA

RISTRUTTURAZIONE CON INTERVENTI STRUTTURALI ANTISISMICI DI UNA PALAZZINA DI PROPRIETA' ATER SITA A VERONA VIA MERANO N. 14 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOCIAL HOUSING

ALLEGATO: S - elaborati grafici


Tav. 03 SCHEMA PONTEGGI

proprietari
**A.T.E.R.
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**


coordinatore alla Sicurezza
arch. Luca Bazzoni



DATA: 24.07.2020 FILE: TAV_03_SCHEMA PONTEGGI


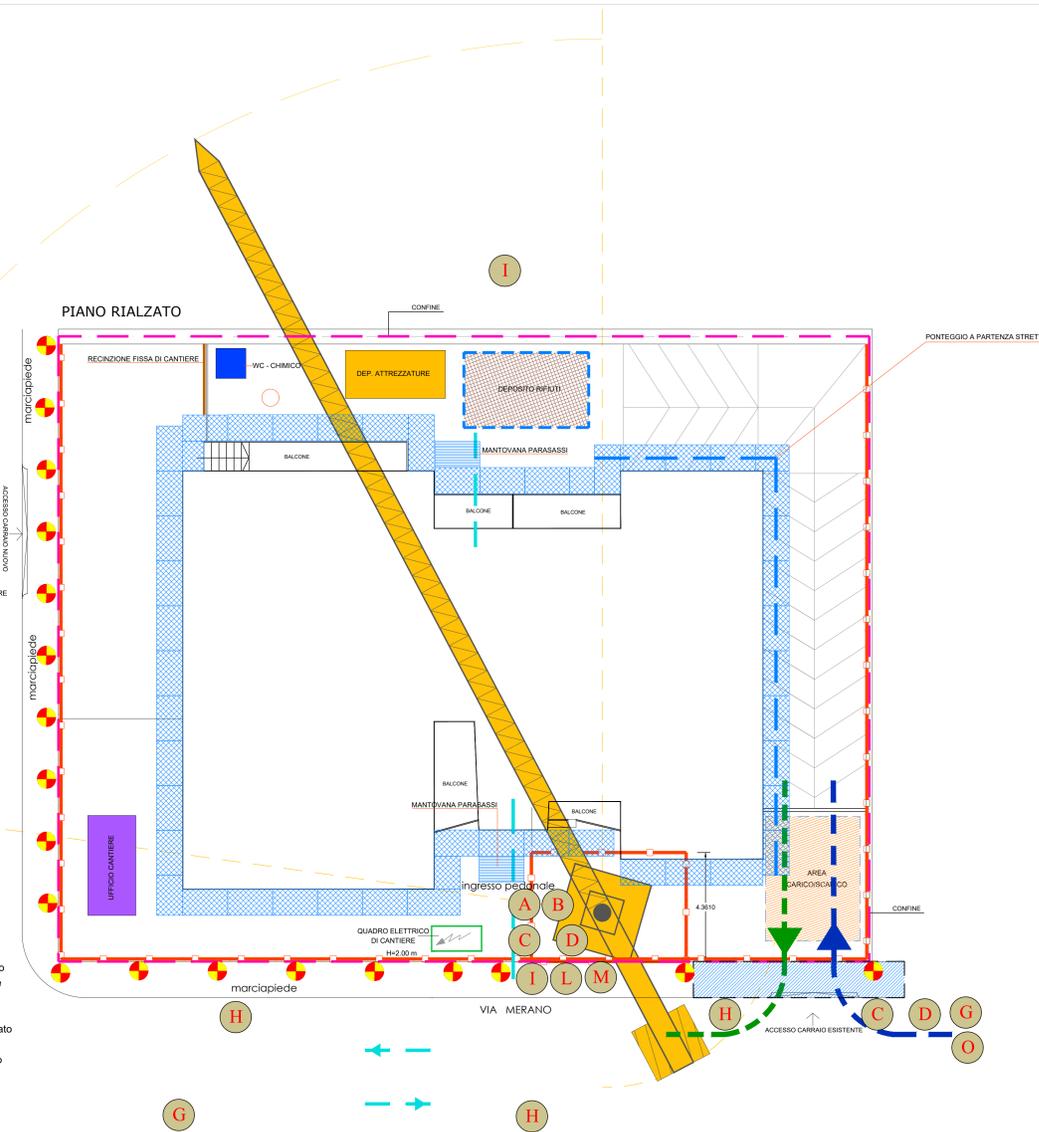


SCHEMA INSTALLAZIONE DEL PONTEGGIO: ELEMENTI E FASI DI MONTAGGIO

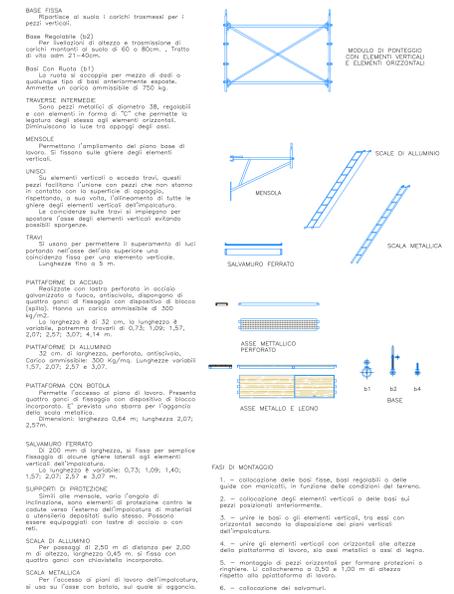

NOTE PONTEGGIO:
Per la realizzazione del ponteggio il titolare o persona competente dell'impresa addetta al montaggio/smontaggio ponteggi deve emettere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (P.M.U.S.). Il ponteggio metallico deve possedere l'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Tale autorizzazione è la parte iniziale del "libretto del ponteggio", il quale (o copia dello stesso) deve essere mantenuta in cantiere.
Qualora vengano realizzati ponteggi che non corrispondano a quanto riportato nell'autorizzazione ministeriale sul Libretto del ponteggio sarà necessario predisporre un apposito progetto di verifica firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, completo di tutti i disegni esecutivi. Copia del progetto dovrà essere mantenuta in cantiere.
Ultimata la fase di montaggio del ponteggio si procederà alla verifica ed al rilascio del libretto d'uso dello stesso.

SCHEMA SULLA LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO



- PRESCRIZIONI:**
1. Il direttore tecnico di cantiere dovrà informare gli autisti riguardo le prescrizioni sulla viabilità contenute nel presente P.S.C. e dovrà formare tali operatori riguardo le modalità di accesso ed uscita dall'area di cantiere.
 2. All'interno del cantiere i percorsi pedonali dovranno essere delimitati da recinzione temporanea modulare per cantieri, composta da pannelli di rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) avvolta su struttura metallica.
 3. La Notifica Preliminare dovrà essere esposta all'esterno del cantiere possibilmente in corrispondenza del cartello di cantiere. Dovrà essere concordato con il coordinatore il luogo da destinarsi ad ufficio, dove depositare la documentazione relativa alla sicurezza del cantiere, così come riportato nel Piano di sicurezza e coordinamento.
 - 4.
